

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

أمانة جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

اعمال ممرات المشاة للمخطط رقم (10)

طلب فحص اعمال

الحي	الامير فواز

رقم 4 P.S

التاريخ / الوقت	2024/2/26

☑ تقديم جديد ☐ إعادة تقديم

اسم الشارع :	ST B10-3-L	من :	ST0+000	إلى :	ST0+150

نوع العمل :


حفر مسار البلدورة	فرشة نظافة البلدورة	تركيب البلدورة	تنزيل طبقة صب بيس	فرشة رمل للبلاط المتداخل	تركيب البلاط المتداخل
✓	✓	✓	✓	✓	✓

السيد / مدير المشروع الاستشاري .... تحيه طيبة وبعد ،،،

يرجى معاينة الاعمال المذكور بيانها مع مندوب المقاول

....

المساح


1- تم استلام الاعمال  ✓

2- تم رفض الاعمال 

الاسم : ....

التوقيع : .... [signature]

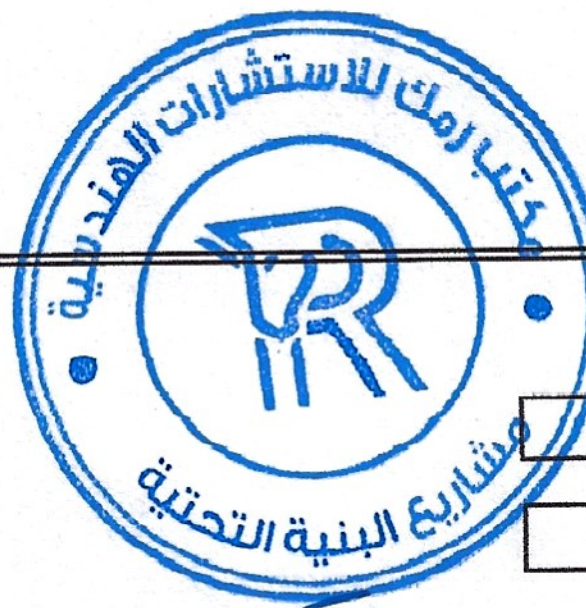
المراقب

1- تم استلام الاعمال  ✓

2- تم رفض الاعمال 


الاسم : ....


التوقيع : ....



سبب الرفض :

خطاء في الاحداثيات 

خطاء في المناسيب 

السطح غير جاهز 

خطاء في التركيب 

الملاحظات : تم التنبيه على التأكد من استواء ونظافة الحفر من المخلفات قبل صب الخرسانة

المقاول

م/ محمد غمري

التوقيع .... [signature]



الاستشاري

م/ حسام محمد ....

التوقيع [signature]



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

info@ramakcompany.com 0506151166 الجوال 0504714479 مدير المشاريع

أمانة جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

اعمال ممرات المشاة للمخطط رقم (10)

طلب فحص اعمال رقم 5 P.S

الحي	الامير فواز

التاريخ / الوقت	202 / /

☑ تقديم جديد ☐ إعادة تقديم

اسم الشارع :	ST B10-3-L	من :	ST0+000	إلى :	ST0+150

R

نوع العمل :

حفر مسار البلدورة	فرشة نظافة البلدورة	تركيب البلدورة	تنزيل طبقة صب بيس	فرشة رمل للبلاط المتداخل	تركيب البلاط المتداخل
	✓				


السيد / مدير المشروع الاستشاري .... تحيه طيبة وبعد ،،،

يرجى معاينة الاعمال المذكور بيانها مع مندوب المقاول

....

المساح


-1 تم استلام الاعمال ✓ 


-2 تم رفض الاعمال 

الاسم : ....

التوقيع : ....

المراقب


-1 تم استلام الاعمال ✓ 


-2 تم رفض الاعمال 


الاسم : ....


التوقيع : ....

سبب الرفض :

خطاء في الاحداثيات 

السطح غير جاهز 

خطاء في المناسيب 

خطاء في التركيب 

الملاحظات : تم التنبيه على معالجة الخرسانة بالرش قبل استكمال الاعمال

المقاول

م/ محمد غمري

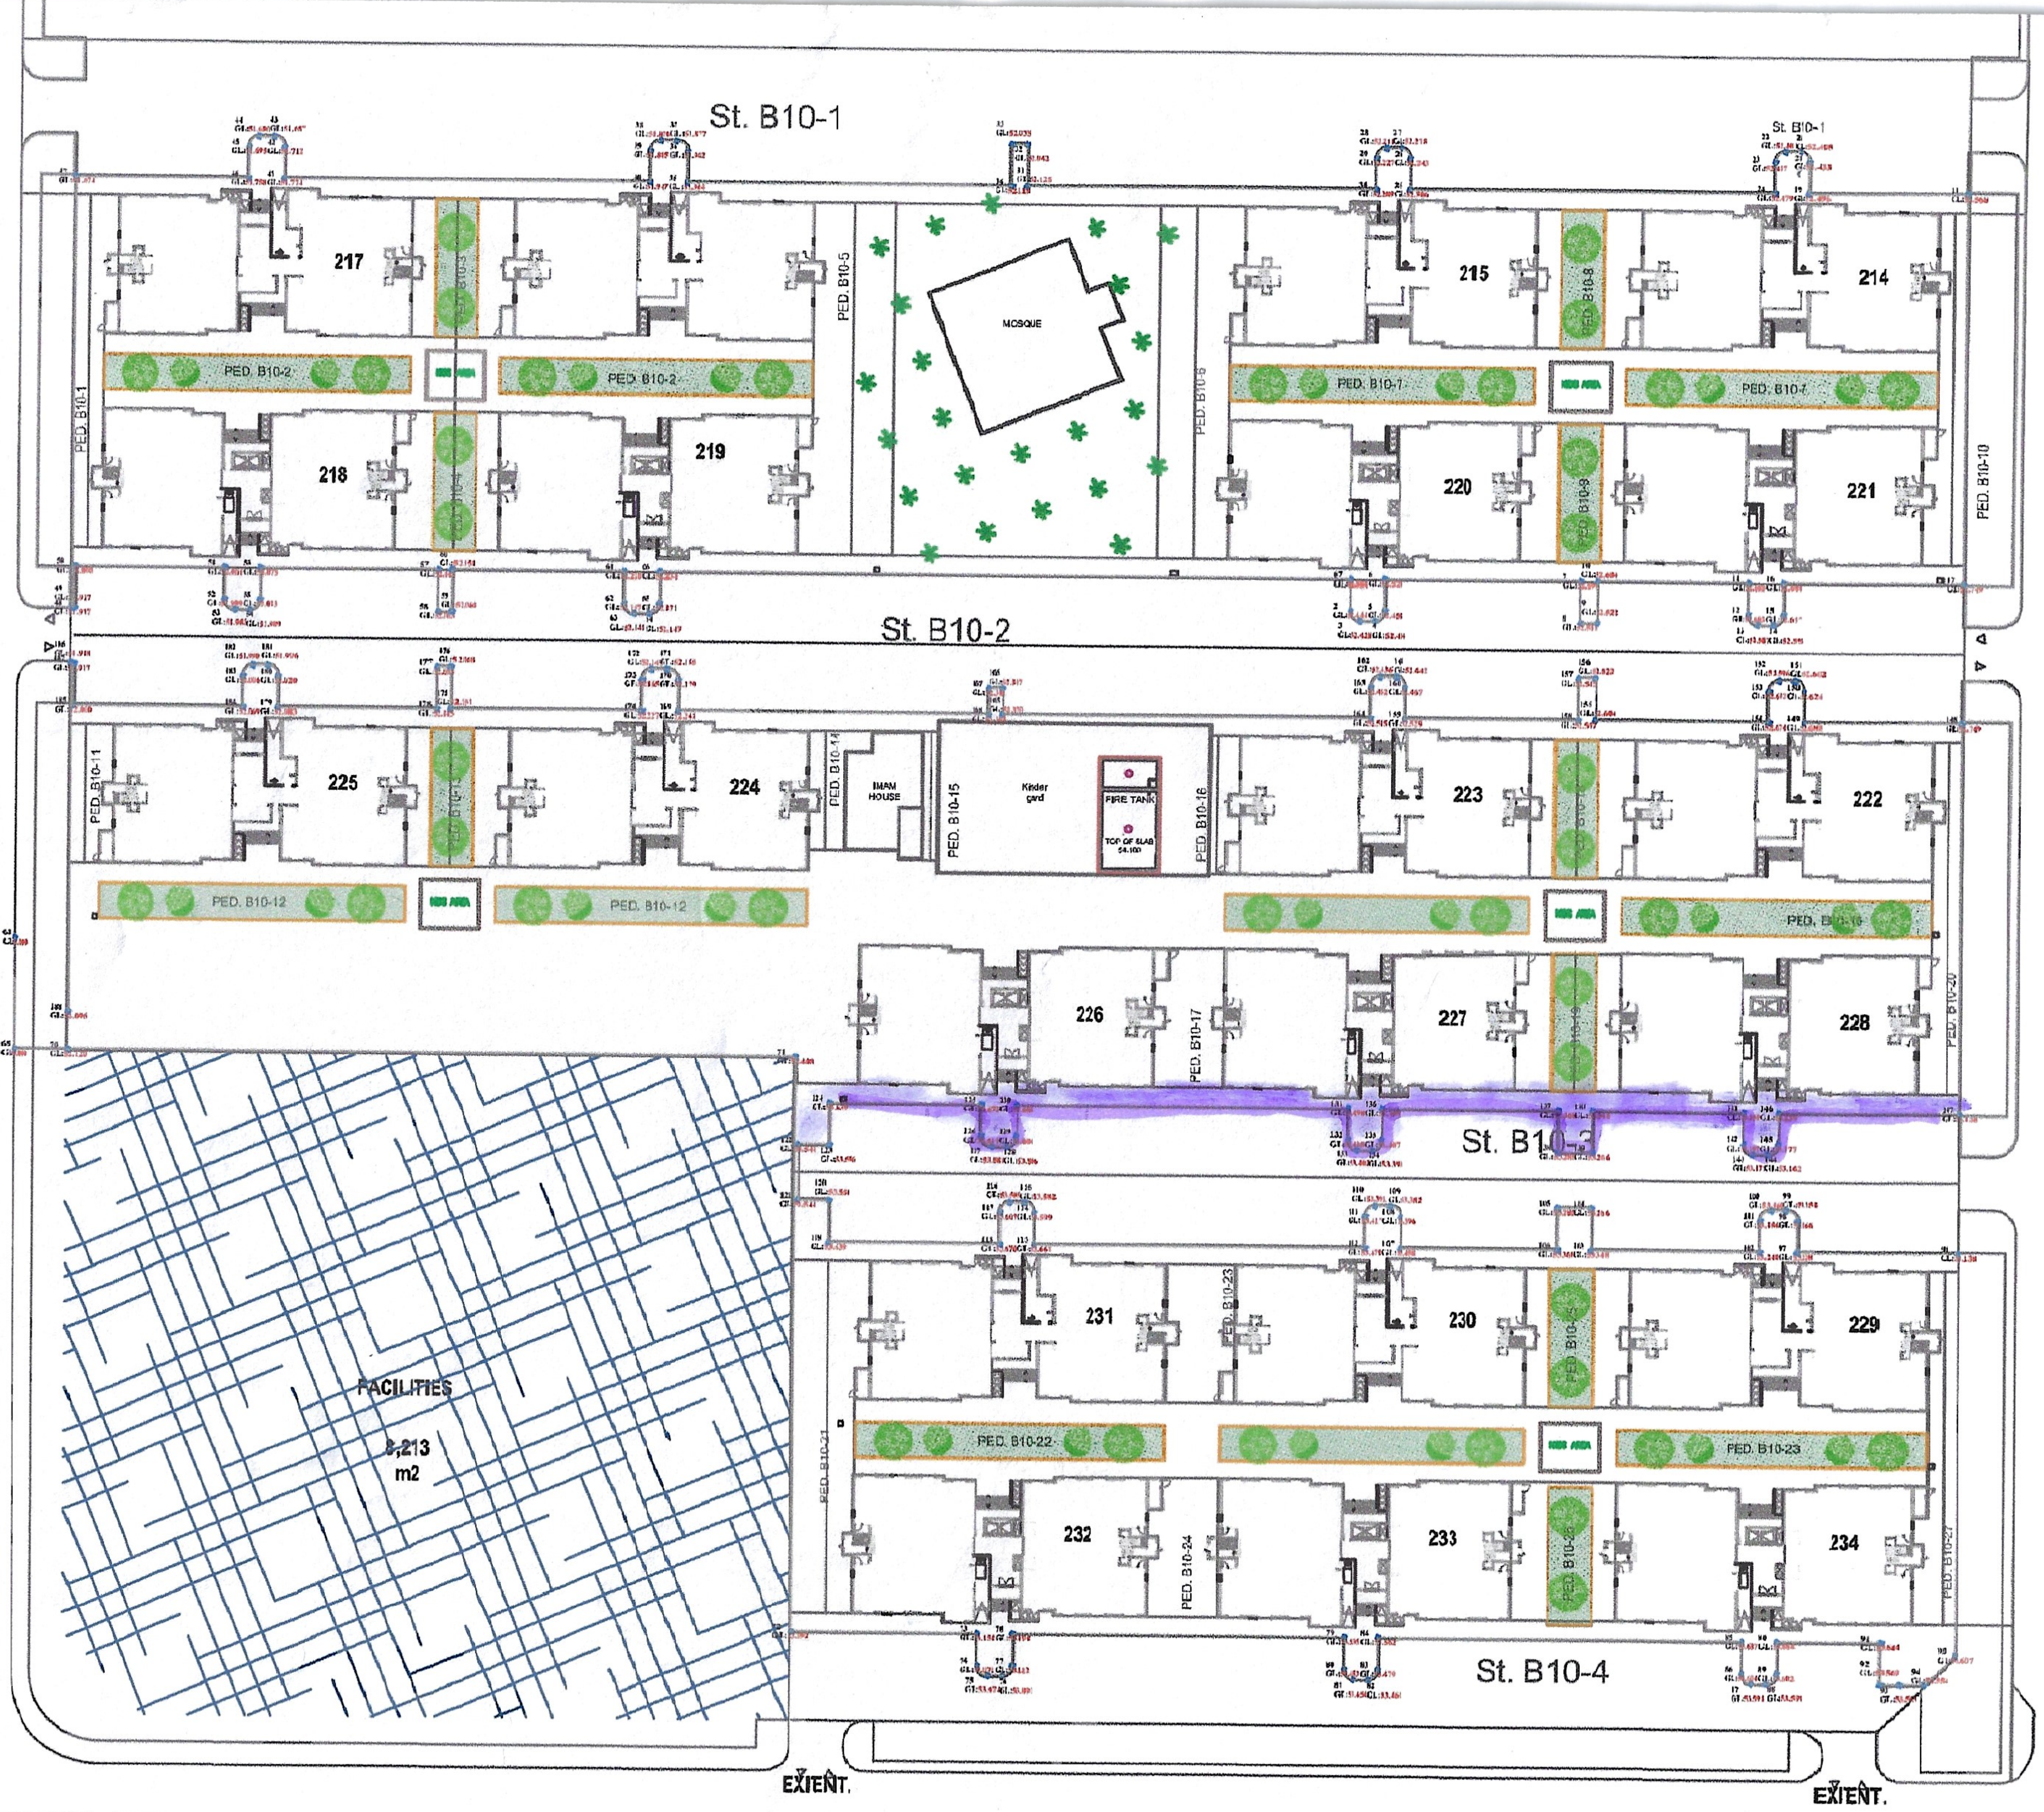
التوقيع ....

الاستشاري

م/ حسام محمد ....

التوقيع





St. B10-1
St. B10-2
St. B10-4
217
218
219
214
215
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
MOSQUE
PED. B10-1
PED. B10-2
PED. B10-3
PED. B10-4
PED. B10-5
PED. B10-6
PED. B10-7
PED. B10-8
PED. B10-9
PED. B10-10
PED. B10-11
PED. B10-12
PED. B10-14
PED. B10-15
PED. B10-16
PED. B10-17
PED. B10-20
PED. B10-21
PED. B10-22
PED. B10-23
PED. B10-24
PED. B10-27
IMAM HOUSE
Kinder gard
FIRE TANK
TOP OF SLAB
FACILITIES
8,213
m2
EXTENT.
EXTENT.
